



REPORT

EXECUÇÃO DE PROJETOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (MG)

Nº 05


31/05/2025

Clique no mapa ao lado e navegue por região

[Clique aqui](#) para acessar os projetos que abrangem toda a bacia

[Clique aqui](#) para acessar o sumário de projetos

Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo

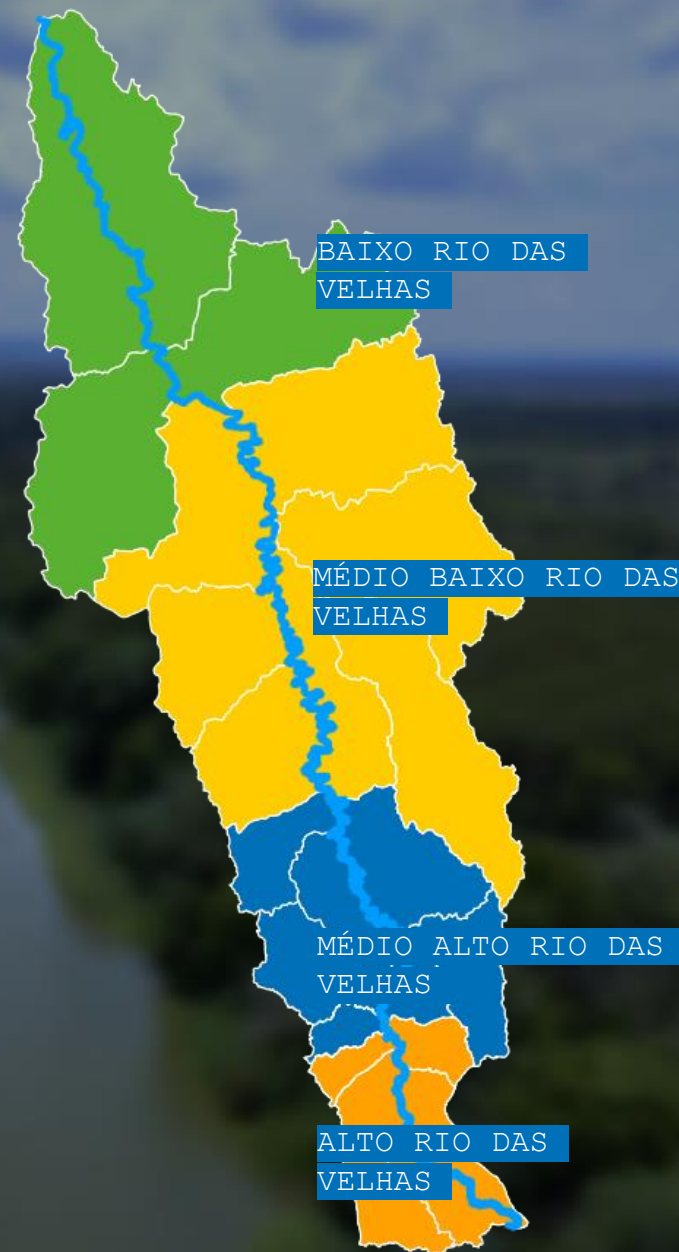



A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.

O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.

TODA A BACIA DO VELHAS

1. PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAIÁ-PACUÍ
2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 5º ADITIVO
3. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS
4. BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS
5. GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAIS URBANOS
6. MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTEs EXISTENTES NA BACIA
7. EM BREVE NA BACIA DO RIO DAS VELHAS

ALTO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS – MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
2. EM BREVE NO ALTO RIO DAS VELHAS

MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)
2. PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 1)
4. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
5. EM BREVE NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG
2. EM BREVE NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

BAIXO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
4. EM BREVE NO BAIXO RIO DAS VELHAS

TODA A BACIA DO VELHAS



PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



EMPRESA CONTRATADA
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
10/08/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.701.792,02



DURAÇÃO DO PROJETO
19 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 1.224.271,18




NÚMERO DO CONTRATO
020/2022



PRÓXIMAS ETAPAS
Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento da SF5 e Programa de efetivação da SF6 concluído



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: ESTA É UMA CONTRATAÇÃO DO CBHSF NA QUAL O CBH DO RIO DAS VELHAS É BENEFICIÁRIO.



TODA A BACIA DO VELHAS



PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 7º ADITIVO



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
12/09/2019



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 8.965.418,5



DURAÇÃO DO PROJETO
72 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 8.385.282,48



NÚMERO DO CONTRATO
010/2019




PRÓXIMAS ETAPAS
Continuidade das ações de comunicação
Aguardando nova licitação



FISCAL TÉCNICO APV
SUZELEI ROCHA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



TODA A BACIA DO VELHAS



CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO CORPORATIVO (LOGÍSTICAS)



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
KEPLER VIAGENS, EVENTOS E
TURISMO EIRELI – ME



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
20/05/2022



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 405.705,84



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 192.464,03



NÚMERO DO CONTRATO
020/2022



PRÓXIMAS ETAPAS
Atendimento às reuniões, eventos e
visitas técnicas do Comitê



FISCAL TÉCNICO APV
SAMELA BITENCOURT



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO VELHAS



BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
FUNDEP



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/02/2020



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.638.178,74



DURAÇÃO DO PROJETO
60 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 3.168.542,88



NÚMERO DO CONTRATO
001/2020




PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega do Produto 10
Avaliação do Produto 10



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO COIMBRA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO VELHAS



GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAIS URBANOS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
24/04/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.315.258,54



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 1.016.037,26



NÚMERO DO CONTRATO
011/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Finalização dos termos de referência;
Elaboração do último relatório de produção mensal



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO VELHAS



MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTEs EXISTENTES NA BACIA - 3º Aditivo



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
TANTO DESIGN LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/02/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.777.113,27



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 3.361.830,84



NÚMERO DO CONTRATO
004/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
Avaliação do produto 27



FISCAL TÉCNICO APV
DIMAS SILVA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

ALTO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS - MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ



LOCAL DE EXECUÇÃO
OURO PRETO (MG)
MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
UTE NASCENTES



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
31/07/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
26 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
024/2024



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME GUERRA



EMPRESA CONTRATADA
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.766.653,00



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 2.357.998,25



PRÓXIMAS ETAPAS
8º boletim de medição

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**





NO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MANGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG – UTE RIBEIRÃO DO ONÇA
RESULTADO: LICITAÇÃO DESERTA
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO (MACIEL E ENGENHO D'ÁGUA) – PRÉ-CONTRATAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)



LOCAL DE EXECUÇÃO
SANTA LUZIA /MG E LAGOA SANTA/MG
UTE PODEROSO VERMELHO,
UTE CARSTE, UTE RIO TAQUARAÇU



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
01/11/2023



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
043/2023



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA
DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 593.813,64



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 593.813,64



PRÓXIMAS ETAPAS
PM RVSEM aprovado na CPB/COPAM
PM APAM aprovado no CODEMA Santa Luzia

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

100%



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)



LOCAL DE EXECUÇÃO
SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
UTE RIBEIRÃO DA MATA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
01/11/2023



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
048/2023



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA
DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 419.736,92



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 419.736,92




PRÓXIMAS ETAPAS
Entregue para IEF
Pendente de aprovação na CPB/COPAM

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

100%



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 1)



LOCAL DE EXECUÇÃO

OURO PRETO (MG) – MACIEL
UTE NASCENTES
JABOTICATUBAS (MG) – SÃO JOSÉ DA SERRA
UTE JABÓ/BALDIM



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
18/03/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
008/2024



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



EMPRESA CONTRATADA

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESTAÇÕES
SUSTENTÁVEIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 326.700,00



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 326.700,00



PRÓXIMAS ETAPAS

Projeto concluído em maio/25
Instrução de processo licitatório para a
contratação da execução das intervenções

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO

100%



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



EMPRESA CONTRATADA
DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
17/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 463.024,62



DURAÇÃO DO PROJETO
09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 46.302,46



NÚMERO DO CONTRATO
085/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega dos cadastros de famílias



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS, CAETÉ MG.



LOCAL DE EXECUÇÃO
CAETÉ/MG
UTE RIO TAQUARAÇU



EMPRESA CONTRATADA
PROBIOMAS PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
24/02/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.179.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
18 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
005/2025





PRÓXIMAS ETAPAS
1º Relatório mensal de execução de obras



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

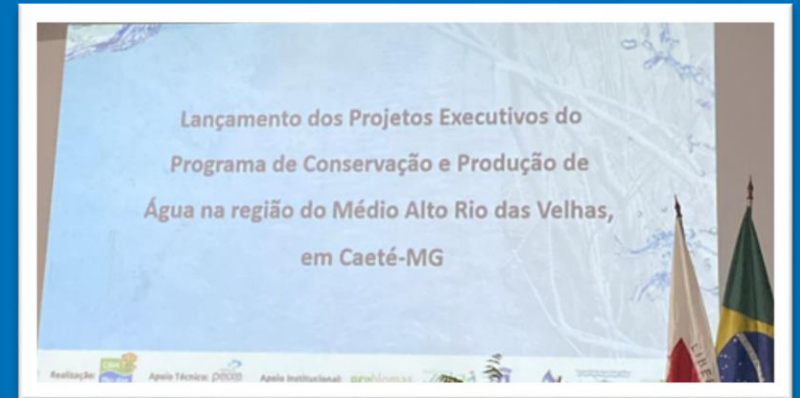



NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

- 1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG – UTE JABÓ/BALDIM**
- 2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ/MG – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ**
- 3. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE ESMERALDAS/MG – UTE RIBEIRÃO DA MATA**
- 4. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS (SÃO JOSÉ DA SERRA) – PRÉ-CONTRATAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
CONGONHAS DO NORTE (MG)
COMUNIDADE LAGOA
UTE RIO CIPÓ, UTE RIO PARAÚNA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
06 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
052/2024



FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 835.250,60



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 835.250,60



PRÓXIMAS ETAPAS
Projeto concluído

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

100%



MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, NA MICROBACIA DO CÓRREGO SOBERBO – UTE RIO CIPÓ, EM SANTANA DO RIACHO/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
SANTANA DO RIACHO/MG
UTE RIO CIPÓ



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 7.188.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
18 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
004/2025



PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG – UTE SANTO ANTÔNIO/MAQUINÉ

BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
VÁRZEA DA PALMA (MG)
MICROBACIA Córrego Pedras Grandes
UTE GUAICUÍ



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/07/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
036/2024



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



EMPRESA CONTRATADA
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.336.000,00



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 2.094.879,72



PRÓXIMAS ETAPAS
9º boletim de medição emitido
10º boletim de medição

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
DIAMANTINA (MG)
COMUNIDADE BATATAL
UTE RIO PARDO



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
051/2024



FISCAL TÉCNICO APV
FLÁVIA MENDES



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.087.619,80




VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 1.205.169,20



PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais
de esgotamento sanitário

**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**

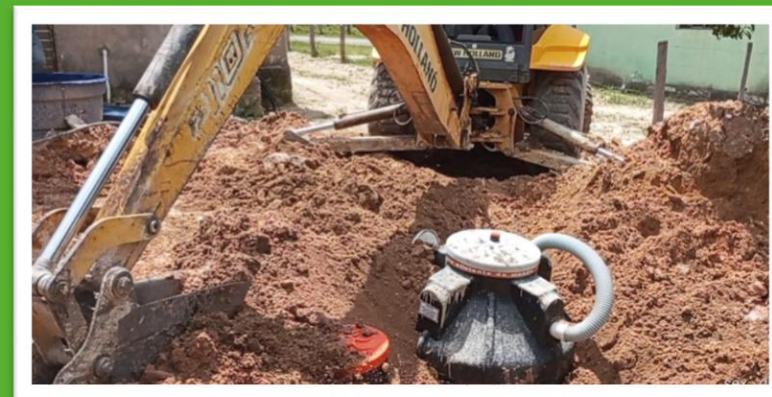

BAIXO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
17/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 463.024,62



DURAÇÃO DO PROJETO
09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ MAIO/25
R\$ 46.302,46



NÚMERO DO CONTRATO
085/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Entrega dos cadastros de famílias



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas



NO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

EXPEDIENTE

CBH DO RIO DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho
Presidenta

Ronald de Carvalho Guerra
Vice-presidente

Renato Junio Constâncio
Secretário

Heloisa Cristina França Cavallhier
Secretário Adjunto

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente do Conselho de Administração

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Diretora Geral

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças

Jacqueline Evangelista Fonseca
Gerente de Projetos

Ohany Vasconcelos Ferreira
Gerente de Integração

André Amaral Horta
Gerente de Gestão Estratégica

Daniel Brito
Projeto gráfico

Suzelei Soares Rocha
Analista de Comunicação
Produção e revisão final

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico
Produção e revisão final



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

www.cbhvelhas.org.br | @cbhriodasvelhas

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

www.agenciapeixevivo.org.br | @agenciapeixevivo
